

都市計画公園整備の進捗状況について

1 鎌倉公園整備事業

(1) 事業内容

本事業は、新小平駅周辺地域のまちづくりの一環として、都市の貴重な緑地を保全し、市の特徴的な農地を活用し、地域の魅力向上やにぎわいを創出するため、鎌倉公園整備基本計画に基づき整備を行います。

(2) 概要

- ① 位 置 小平市小川町二丁目地内
- ② 告示年月日 昭和38年9月2日
- ③ 計画決定面積 約29,000㎡
- ④ 種 別 近隣公園

(3) 事業認可

- ① 認 可 日 令和3年8月20日
- ② 認可面積 約20,000㎡


(4) これまでの主な取組

- 平成28年度 基礎調査
- 平成29年度 アンケート調査
- 令和元年度 鎌倉公園ワークショップ
- 令和2年度 事業概要説明会・オープンハウスの開催、パブリックコメント、鎌倉公園整備基本計画策定
- 令和3年度 遊具に関するワークショップ及び意見収集、事業認可取得、用地説明会
- 令和4年度 基本設計（サウンディング調査含む）、用地取得業務

(5) 今後の主な予定

- 令和5～6年度 設計、用地取得業務
- 令和7～8年度 整備工事・工事实施箇所の開園

鎌倉公園案内図

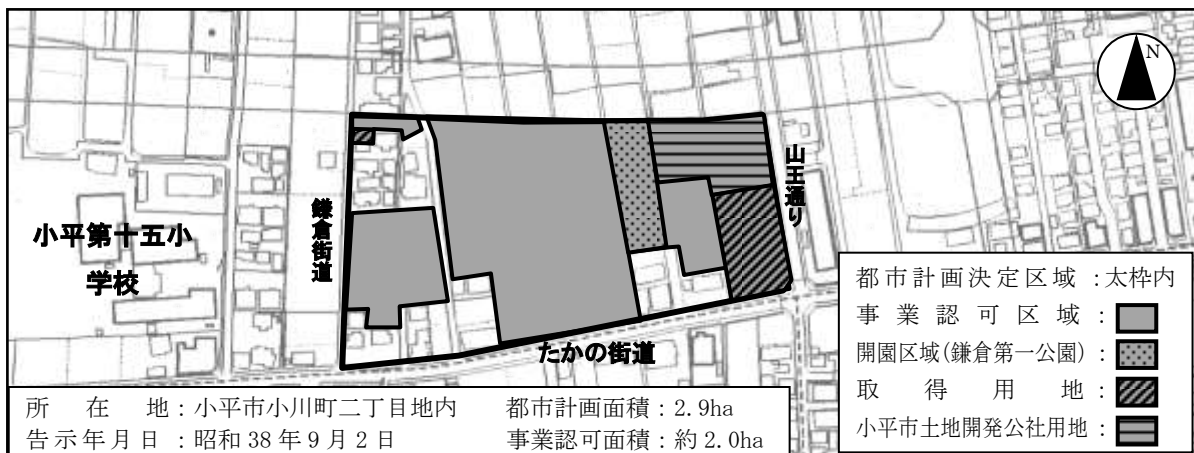

2 鷹の台公園整備事業

(1) 事業内容

本事業は、昭和38年に都市計画公園として都市計画決定している用地（旧学校グラウンド跡地）を取得し、公園として整備する事業です。令和3年度から4年度にかけて、今後の鷹の台公園整備に向けた地域の意見・要望の把握や、課題解決に向けた公園のあり方、公民連携の仕組・制度設計、効果的かつ効率的な都市公園の管理・運営等を調査・検討することを目的として、鷹の台公園のあり方調査検討を行ってきました。

現在、「鷹の台公園のあり方調査検討業務委託報告書」を基に、サウンディング型市場調査を行っており、民間事業者から優良な提案を引き出すことで、今後の具体的な検討に向けた参考とします。

(2) 概要

- ① 位 置 小平市たかの台33
- ② 告示年月日 昭和38年9月2日
- ③ 計画決定面積 約19,000㎡
- ④ 種 別 近隣公園
- ⑤ 整備区域 約13,000㎡（旧グラウンド跡地部分）

(3) これまでの主な取組

- 令和元年度 公園整備予定地取得（小平市土地開発公社）
- 令和2年度 小平都市計画公園3・3・4号（鷹の台公園）等に関するアンケート調査


鷹の台公園のあり方調査・検討

- 令和3年度 市民ヒアリング、都市公園セミナー、職員ヒアリング、職員研修 等
- 令和4年度 鷹の台公園マルシェ、鷹の台公園いどばたかいぎ 等

(4) 今後の主な予定

- 令和4年度 サウンディング型市場調査
- 令和5年度 鷹の台公園整備基本計画策定、公民連携の仕組みの検討、条例改正
- 令和6年度 鷹の台公園整備事業認可、鷹の台公園用地取得
- 令和7年度 鷹の台公園設計
- 令和8年度 鷹の台公園整備工事

鷹の台公園案内図

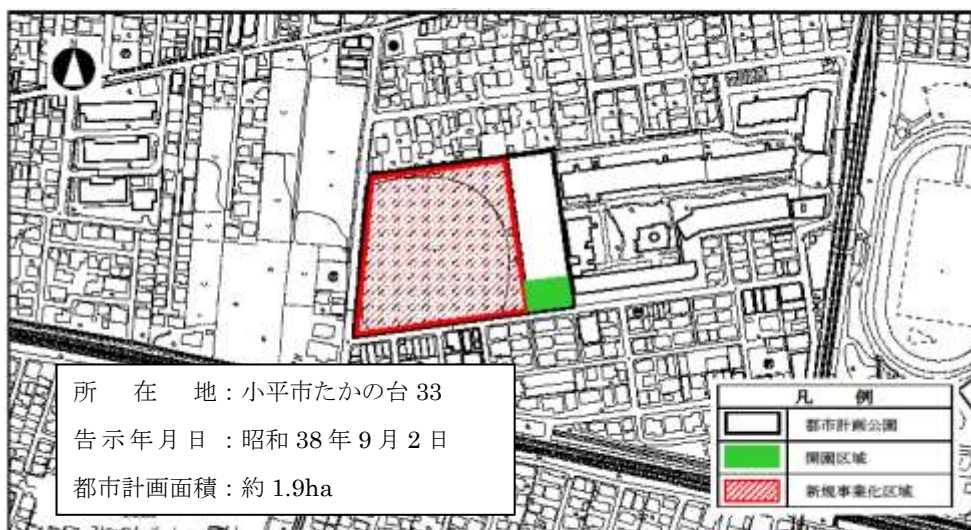

【参考】都市計画公園位置図

